



Université Cheikh Anta Diop

.....
École de Bibliothécaires, Archivistes et Documentalistes

Master 2 :
Science de l'information documentaire

**CONCEPTION ET GESTION
DE PROJET DOCUMENTAIRE**

Module 1

**DEFINITION ET ELEMENTS D'UN
PROJET**

Chargé de cours :
Mohamed DIOP

Doctorant LARSIC

Année académique 2025 – 2026

1. DEFINITIONS :

Ce cours intitulé Conception et gestion des projets documentaires vise un ensemble de méthodes et d'outils servant à permettre la réalisation et la livraison d'un produit ou d'un service documentaire avec un niveau de qualité défini en amont, dans les délais et couts prévus.

Il est construit à partir des connaissances en gestion des projets de manière générale, mais vise à aider les professionnels de l'information documentaire à mettre en place des projets dans les domaines de la documentation et des archives.

Le terme de « **projet** » est apparu XVI^e siècle. Il provient du latin **projicere**, qui veut dire « **jeter en avant** ». Il implique un point de départ, sur lequel on se base pour se lancer en avant, vers un but, un objectif.

Il existe plusieurs définitions données au concept de projet. Nous en retiendrons 3 :

- « *Un projet est un ensemble d'actions coordonnées faisant appel à diverses compétences et ressources de l'entreprise (acteurs, matériels, etc.) pour atteindre un but, concrétiser une intention.* » (Marchat, 2003).
- « *Un projet est un processus qui consiste en un ensemble coordonné et maîtrisé, comportant des dates de début et de fin, entrepris dans le but d'atteindre un objectif conforme* ». (ISO – 10006 _ Organisation Mondiale de Normalisation)

- « *Un projet est un système complexe **d'intervenants**, de **moyens** et **d'actions**, constitué pour apporter une réponse à une **demande élaborée** pour satisfaire au **besoin** d'un maître d'ouvrage ; le projet implique un **objectif physique ou intellectuel**, des **actions à entreprendre** avec des **ressources données**. » (Norme AFNOR)*

Cela signifie que **concevoir et gérer un projet (documentaire)**, a pour but d'améliorer le cadre et les conditions de travail du professionnel de l'information documentaire (*bibliothécaire, documentaliste, archiviste, conservateur*) et des usagers ; c'est d'abord comprendre clairement les besoins ensuite fixer les objectifs à atteindre, puis identifier les moyens matériels, financiers et humains à mobiliser en vue de réaliser les objectifs escomptés, et enfin fixer un délai de démarrage et de fin de la réalisation du projet. Pour ce faire, il faut respecter l'équilibre triangulaire : **qualité/cout/ délais**.

1.1 Ordonnancement des projets

L'ordonnancement consiste à rédiger les besoins en ressources ou à anticiper l'avancement des parties du projet sur leur temps. C'est planifier, ordonner, rationaliser l'ensemble des besoins en ressources, des tâches nécessaires, à la réalisation du projet en respectant les contraintes et en accordant une attention particulière au personnel, au matériel et aux finances. Les techniques d'ordonnancement dans le cadre de la gestion d'un projet ont pour objectif de répondre au mieux aux besoins exprimés par un client, au meilleur coût et dans les meilleurs délais, en tenant compte des différentes contraintes.

1.2 Suivi des projets

Le suivi d'un projet est un outil de contrôle et de validation. Le suivi d'un projet consiste à mesurer l'état des opérations du projet, à transmettre les informations au centre de contrôle qui vérifie que les opérations se déroulent conformément au programme et à mettre en œuvre les actions rectificatrices au besoin. Il permet à travers des réunions tenues à cet effet, de détecter les problèmes ou anomalies plus facilement dans l'exécution des tâches pour ainsi réagir rapidement afin de trouver une solution adéquate. Les avantages du suivi sont multiples. Il permet :

- Une meilleure visibilité sur l'évolution du projet ;
- Une meilleure gestion des ressources et par conséquent une optimisation des coûts ;
- La réduction des risques comme des retards de livraison par exemple ;
- La responsabilisation des collaborateurs et un meilleur partage d'information, etc.

2. COMPOSANTES ESSENTIELLES D'UN PROJET

2.1 *Qu'est-ce qu'un projet documentaire ?*


Un projet documentaire peut être :

- ⇒ La création d'une bibliothèque, d'un centre de documentation ou d'un service d'archives (pour une entreprise, ou d'une toute autre organisation publique ou privée) ;
- ⇒ Le renouvellement d'un fonds documentaire ;
- ⇒ La numérisation ou la valorisation d'un fonds documentaire ;
- ⇒ La création d'un site web ou d'un portail web ;
- ⇒ La mise en place d'un réseau documentaire, d'un SIGB ;
- ⇒ La modernisation d'un service documentaire (équipement, mobilier, informatisation, extension, réhabilitation, rénovation, informatisation) ;
- ⇒ Etc.

Pour le professionnel de l'information documentaire, le projet documentaire est une aventure qui mêle à la fois des expériences (positives et négatives), une équipe ayant un seul objectif, des moyens divers et satisfaisants, etc.

Il repose donc sur l'assemblage des diverses composantes, leur articulation et leur coordination.

2.2 Composantes d'un projet (documentaire)

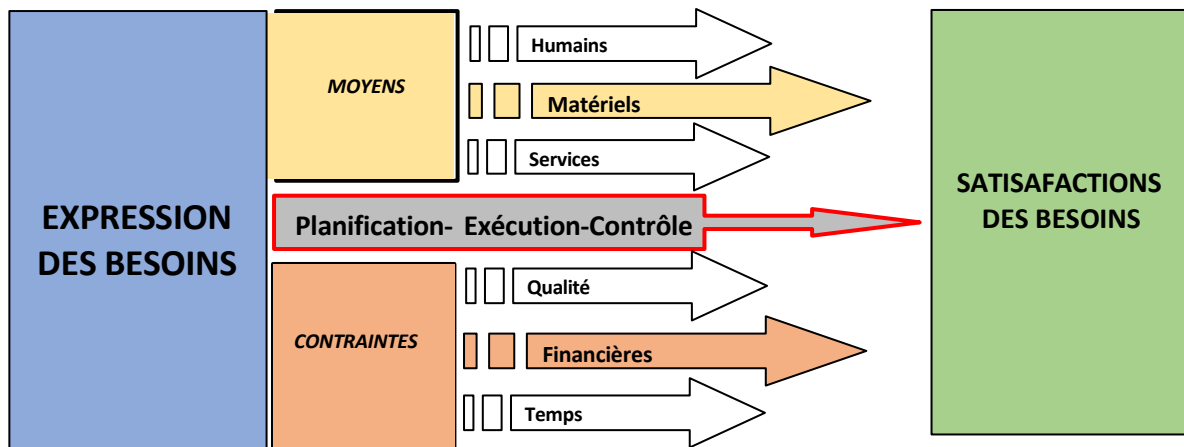

Selon le schéma ci-dessus, les composantes d'un projet (documentaire) reposent sur les éléments suivants :

- **Les enjeux** : c'est le caractère stratégique du projet
- **L'innovation** : la créativité, pas de référence *à priori*
- **L'ensemble fini** : début et fin (strict)
- **Les intervenants** : sens de la coopération de la coordination
- **Le caractère aléatoire** : éléments non maitrisable (liés au facteur humain, à la technicité du projet)
- **La transversalité** : les acteurs, les moyens peuvent provenir de différentes unités (source), de l'unité d'information-même (ou de l'extérieur).

Pour coordonner tous ces éléments indiqués en vue d'arriver au résultat visé, il faut nécessaire une **ORGANISATION** des différentes étapes à savoir :

- **Le schéma directeur** (souvent pour les gros projets) : il rassemble toutes les intentions de l'entreprise ou du service d'information (SI) pour une période donnée. A ce stade, le projet n'existe pas puisque la viabilité de l'intention n'est pas vérifiée. Le schéma directeur va articuler les intentions dans le temps en donnant lieu à un planning qui fera apparaître l'enchaînement chronologique des intentions.
- **L'étude préalable** : dans cette étude, l'intention est « raffinée », le problème cerné est plus près, plus claire.
- **L'étude d'opportunité** : elle permet d'évaluer si les moyens dont on dispose et la volonté dont on fait montre sont favorables à la poursuite du projet. On juge ainsi de l'opportunité de transformer une intention en projet.
- **L'étude du projet en soi** : il s'agit de mettre en œuvre l'ensemble des paramètres qui composent le projet pour atteindre des objectifs précis, quantifiés et mesurables.

👉 **(NB : l'étude d'opportunité et du projet en soi, constituent l'ETUDE DE FAISABILITE)**

Il existe aussi cinq aspects attribués à la gestion des projets :

- **Aspect fonctionnel** : réponse à un besoin ; découpage du projet et définition de la liste des tâches
- **Aspect technique** : respect des spécifications et des contraintes ; définition de l'enchaînement des tâches
- **Aspect organisationnel** : respect d'un mode de fonctionnement (fonction, rôles, résistance au changement)
- **Aspect délais** : planning les échéances ; (contraintes sur certaines tâches)
- **Aspect coût** : respect du budget.

2.3 Définitions d'autres concepts d'un projet

Dans les trois définitions données pour entamer le module, certains mots sont soulignés pour insister sur leur importance dans la compréhension d'un projet.

Entre autres mots-clés, il convient de définir :

- **Objet** : l'objet du projet définit sa finalité générale (but à atteindre).

***NB** : Si l'objet d projet n'est pas clairement formalisé et écrit, i ne faut pas démarrer le projet.*

- **Produit** : c'est les résultats d'un projet

- **Objectifs** : ils peuvent être déclinés en trois niveaux : le cout, la qualité et le temps. Chaque objectif du projet doit être : quantifiable, mesurable et réalisable.

***NB** : les objectifs généraux doivent être consignés de manière synthétique dans la note de cadrage du projet ou dans la lettre de mission du chef de projet.*

- **Temps** : L'objectif temps définit la façon dont vont s'inscrire les différentes étapes du projet dans le calendrier.

***NB** : L'objectif lié au temps est inscrit dans le calendrier.*

- **Quantité** : Les objectifs de quantité sont consignés dans *le cahier des charges du projet* qui résultera du projet.

***NB** : c'est la quantification des objectifs qui permettra de mesurer l'avancement du projet, et de valider objectivement sa réussite et la conformité du produit.*

- **Coût et charge** : Les objectifs de coût sont le résultat de l'articulation entre le niveau de qualité attendu du projet et le temps requis par les ressources pour l'atteindre.

***NB1 :** Le cout est mesuré à partir de la charge.*

***NB2 :** Le chiffrage permettra de mesurer le retour sur investissement.*

- **Triangle Cout/ Qualité/ Temps :** Les trois niveaux d'objectifs s'articulent dans le triangle Cout/Qualité/Temps. L'une des composantes essentielles des techniques de gestion de projet consiste en l'intégration des modifications survenues durant le projet, et de leur conséquence sur les objectifs, et donc sur le triangle.
- **Facteur de complexité :** C'est la part d'inconnu du projet. Avant de se lancer dans la réalisation d'un projet, il est nécessaire d'en identifier les facteurs de complexité. Par exemple : la difficulté technique fait partie des facteurs de complexité
- **Les deux dimensions d'un projet :** un projet comprend deux dimensions complémentaires :
 - *La réalisation (ou la fabrication) du produit*
 - *Le mode d'organisation relatif à la réalisation (ou fabrication du produit)*
- **Chronologie et simultanéité :** La réalisation d'un projet, c'est-à-dire l'articulation dans le temps des deux dimensions permet de visualiser les grandes phases de la gestion du projet.
 - *La phase 1 : la préparation du projet*
 - *La phase 2 : pilotage du projet, réalisation du produit*
 - *Phase 3 : bilan du projet*
- **Livrables de la gestion de projet :** Les livrables de la gestion de projet sont des documents permettant d'assurer la traçabilité du projet, la communication avec l'ensemble des acteurs et la contractualisation des relations entre les parties du projet. Les principaux livrables générés par la gestion de projet sont les suivants :

- La commande du commanditaire
- La note de cadrage
- Le macro-planning
- Le plan de communication
- Les grilles d'analyse des risques
- Le planning détaillé,
- Les comptes rendus de suivi du projet,
- La grille de bilan de projet.

Maitre d'ouvrage (MOA) : il est donneur d'ordre au profit de qui l'ouvrage est réalisé. Il définit les besoins et les exigences (exigences=requirements) :

- **EX** : Lycée pour la construction d'une bibliothèque scolaire

Maitre d'œuvre (MOE) : organisation ou personne garantes de la réalisation technique des solutions.

- **EX** : L'entreprise chargée de coordonner les différents corps, ou le « réalisateur » projet.

Cahier des charges : Document qui permet de formaliser avec précision les besoins du demandeur.
